



INFORME DE I.N.D

Nº 12.012

HOJA 1 de 2

ELEVADOR DE CASING

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 14** CLIENTE: **PETREVEN S.A.** FECHA **19 04 2022**

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **205** LUGAR DE INSPECCIÓN: **LOCACIÓN**

MARCA: **DENCON** MODELO **DCT 7271** DIÁMETRO **13 5/8**

Nº PARTE: **2139** IDENT Nº **2419** VIGENCIA **6 MESES**


Nº SERIE: **2419** CAPACIDAD **N/A** CASING **X** D.PIPE

Inspección a metal limpio:	Arenado <input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input type="checkbox"/>	Humedas <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Medición de Boca	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuerpo (Fisuras - Estado)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perno Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego Vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perno de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desgaste de Asas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legüeta de Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trabas (Funcionamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seguro de Astas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resorte Principal / Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	



A	13 3/8
C	13 3/8
D	1 15/16
F	3 31/32
J-juego lat.	OK
d-(dia.perno)	1 1/8 X 10 15/16

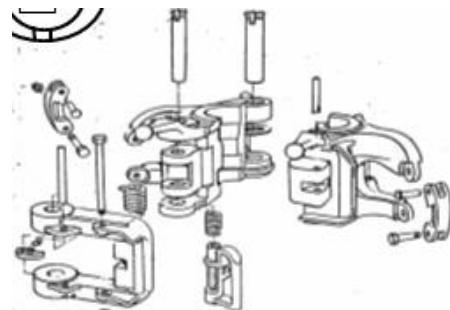

Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MUS. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

**INFORME DE I.N.D****Nº 12.012**

HOJA 2 de 2

ELEVADOR DE CASING

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 14** CLIENTE: **PETREVEN S.A.**

FECHA

19 04 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 205

LUGAR DE INSPECCIÓN:

LOCACIÓN



GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com
