



INFORME DE I.N.D

Nº 13.607

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO


PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA: 19 / 04 / 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 2.740	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: SABINO	MODELO: N/A	CAPACIDAD: 25000 LTS	
INTERNO: 912.	DOMINIO: PIZ 967	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba			N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Tornamesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Perno Rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

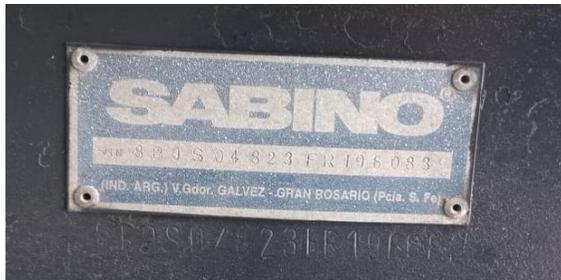

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	SI
---------------------------------------------------	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTO EN VIGENCIA	
	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		



INFORME DE I.N.D

Nº 13.607

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

19 04 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.740


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

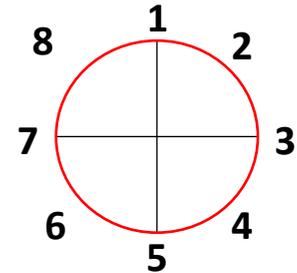

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	5,9	6,0	5,9	6,1	6,0	5,8	5,8
2	6,2	5,9	6,0	6,1	5,8	5,9	5,8
3	6,2	5,8	5,8	6,0	5,9	6,0	5,9
4	6,5	6,0	5,9	5,8	5,6	5,8	5,6
5	6,4	6,1	6,1	5,8	6,0	5,7	5,7
6	6,5	5,9	6,1	6,0	6,0	5,9	5,9
7	6,4	6,1	6,0	6,0	5,8	6,0	5,8
8	6,6	6,0	5,9	6,0	5,9	6,0	5,9
9	6,6	6,0	5,9	5,7	5,9	6,0	5,7

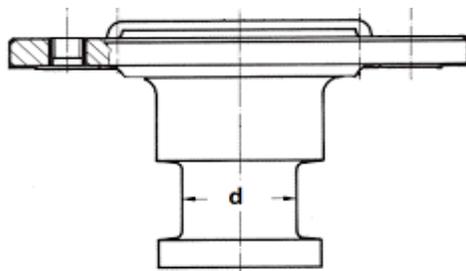

MARCA
 CAPACIDAD
 Nº IDENT.
 DIÁMETRO
 APROBADO SI NO

GM END S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. N° 11 US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN
