


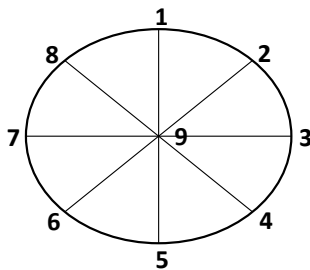
	INFORME DE I.N.D		Nº 14.892	
	TANQUE DE AIRE		HOJA 1 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: SICME S.A.	FECHA:	07 / 02 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: -	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
MARCA: NO POSEE	IDENT Nº: #003	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒
Inspección con Ultrasonido	Falla ☐	Espesor ☒
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas ☐	Secas ☒
Prueba de Estanqueidad	Si ☐	No ☒
	Presión de Diseño	- / KG/CM2
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	- / KG/CM2
	Presión de Trabajo	- / KG/CM2
Tipo de Tanque	Vertical ☐	Horizontal ☒
Producto Almacenado	Aire ☒	Gas Oil ☐


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9295	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

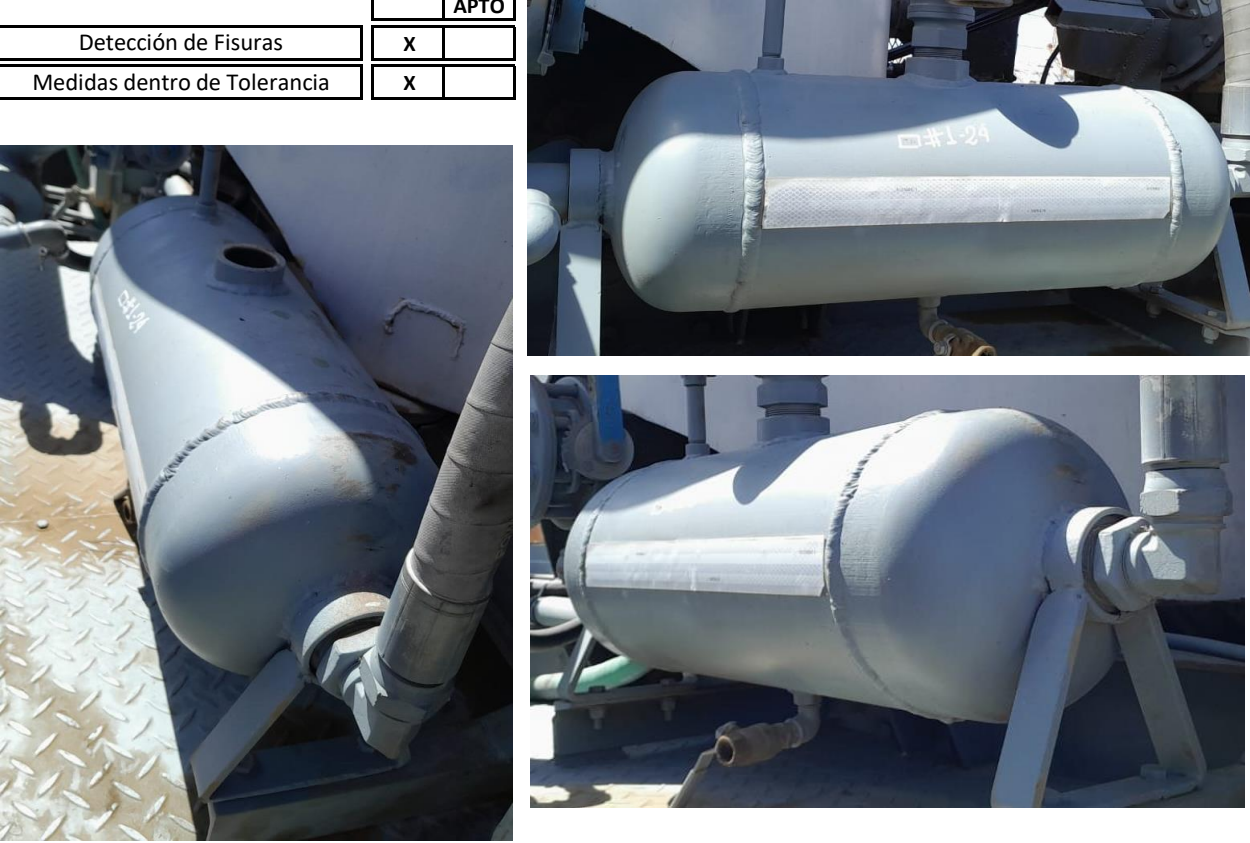

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	8,9	9,2	6,4	6,4	6,6	6,7	6,40
2	9,1	9,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,50
3	8,8	9,2	6,6	6,6	6,6	6,8	6,60
4	9,3	8,8	6,5	6,7	6,8	6,6	6,50
5	9,1	8,9	6,5	6,5	6,6	6,7	6,50
6	9,1	8,9	6,7	6,5	6,8	6,7	6,50
7	8,9	8,8	6,6	6,4	6,6	6,8	6,40
8	8,9	9,1	6,5	6,4	6,7	6,8	6,40
9	9,1	9,2					

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 14.892 HOJA 2 de 2			
	TANQUE DE AIRE					
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: SICME S.A	FECHA:	07	02	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE:	-	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	☒	☐				
Medidas dentro de Tolerancia	☒	☐				
Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		
