


	INFORME DE I.N.D			Nº 16.007																																																																
	CONTROL DE POZO			HOJA 1 de 5																																																																
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	12	10	2024																																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 3.356	L. DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																																
MARCA: SAYI	MODELO: N/A	CAPACIDAD: 25 MTS³																																																																		
INTERNO: CL-65	DOMINIO: AD 504 FH	VIGENCIA: 12 MESES																																																																		
Inspección a metal limpio: ☒ Insp. Us Cisterna ☒ Arenado ☐ Golpeador ☒ Limpieza Mecánica ☒ X Linea/Manifold ☒ X Falla ☐ Espesor ☒ X Inspección por Partículas Mag. Perno Rey ☒ X Humedas ☒ X Tornomesa ☒ X Secas ☐ Quinta R. ☒ X Prueba de Estandueidad Cisterna Prueba Hidraulica Sí ☐ No ☒ X Golpeador ☒ X Linea/Manifold ☒ X Manguerote ☐ Presión de Diseño 2500 PSI Presión de Prueba 2500 PSI Presión de Diseño 2500 PSI Presión de Prueba 2500 PSI Presión de Diseño PSI Presión de Prueba PSI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>50934</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>50935</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table> APTO NO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Detección de Fisuras</td> <td style="width: 10%;">☒</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Estado de Golpeador</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Linea</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cisterna</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table>  Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570 SI							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	Detección de Fisuras	☒		Estado de Golpeador	☒		Estado de Linea	☒		Estado de Cisterna	☒	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																																
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																																
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																																
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																																
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025																																																																
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025																																																																
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																																
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																																
Detección de Fisuras	☒																																																																			
Estado de Golpeador	☒																																																																			
Estado de Linea	☒																																																																			
Estado de Cisterna	☒																																																																			

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS		
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 16.007

HOJA 2 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO 45

☒

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

12

10

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

3.356

L. DE INSPECCIÓN:


BASE CLIENTE

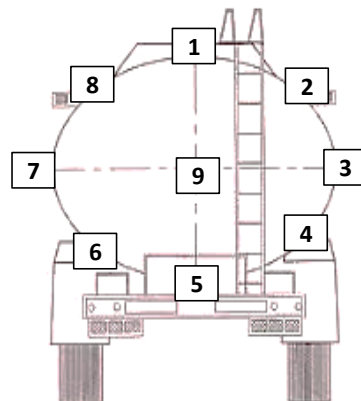

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4
1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,6	6,3
2	6,5	6,4	6,2	6,4	6,4	6,3
3	6,3	6,2	6,3	6,3	6,5	6,4
4	6,2	6,6	6,2	6,2	6,6	6,5
5	6,1	6,6	6,2	6,6	6,2	6,3
6	6,4	6,2	6,1	6,5	6,2	6,2
7	6,5	6,4	6,4	6,3	6,6	6,1
8	6,2	6,5	6,6	6,5	6,5	6,6
9	6,1	6,3	6,5	6,3	6,4	6,5




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORMES DE I.N.D

Nº 16.007

HOJA 3 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO-045 ☒

CLIENTE: CAM SRL




FECHA: 12 10 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐

Nº PARTE: 3.356

L. DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

MEDICIÓN DE ESPESORES US- GOLPEADOR

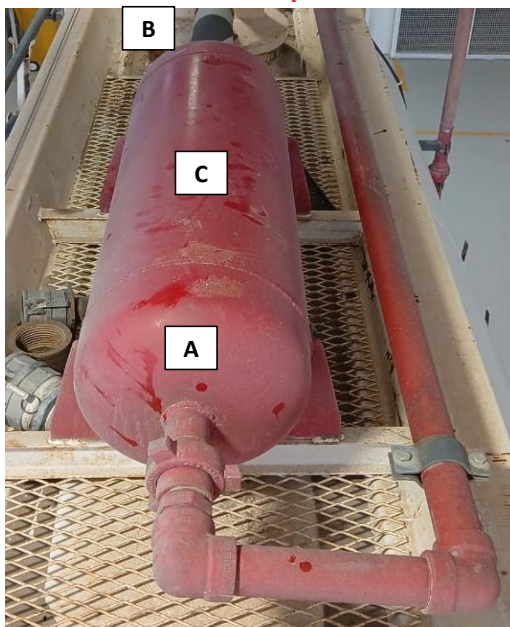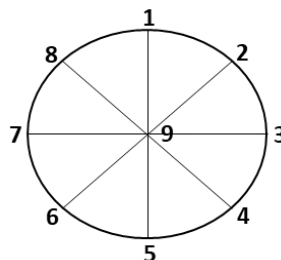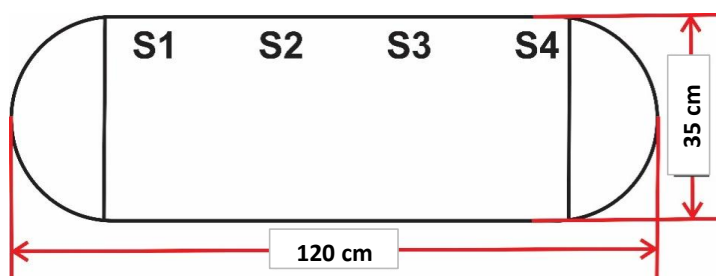

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	ESP. MÍNIMO
1	8,9	6,4	6,3	6,5	6,4	
2	8,8	6,9	6,6	6,5	6,2	
3	8,9	6,5	6,5	6,2	6,3	
4	9,1	6,6	6,4	6,1	6,3	

VALVULA VENTEO

PH: 500 GRS

Nº IDENT.: #65-1 #65-2

DIAMETRO: Ø 4"

APROBADO SI ☒ NO ☐

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORMES DE I.N.D

Nº 16.007

HOJA 4 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO-045



CLIENTE: CAM SRL

FECHA: 12 10 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE




Nº PARTE 3.356

L. DE INSPECCIÓN: BASE CLEINTE

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

	1	2	3	4
PLANO A	8,7	8,5	8,5	8,7
PLANO B	8,4	8,6	8,7	8,4
PLANO C	8,6	8,5	8,5	8,5
PLANO D	8,6	8,8	8,8	8,7
PLANO E	8,6	8,6	8,6	8,5
PLANO F	8,6	8,7	8,7	8,8
PLANO G	8,5	8,6	8,6	8,6
PLANO H	8,4	8,4	8,5	8,4
PLANO I	8,7	8,7	8,6	8,7
PLANO J	8,8	8,5	8,6	8,8
PLANO K	8,7	8,7	8,9	8,9
PLANO L	8,8	8,7	8,6	8,7
PLANO M	8,8	8,8	8,9	8,9
PLANO N	8,9	8,9	8,9	8,9
PLANO Ñ	8,5	8,6	8,6	8,6
PLANO O	8,7	8,7	8,7	8,7
PLANO P	8,8	8,6	8,6	8,5
PLANO Q	8,9	8,9	8,9	8,9
PLANO R	9	9	9,1	9,1
PLANO S	X	X	X	X




GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

F. PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORMES DE I.N.D

Nº 16.007

HOJA 5 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO-045

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

12

10

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐


Nº PARTE

3.356

L. DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

PERNO REY



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65000 LTS

Nº IDENT.

#65-1

DIÁMETRO

Ø 50,9 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐

VALVULA DE SEGURIDAD

PRESINTO

N/A

PH

1500 PSI

Nº IDENT.

#65

DIÁMETRO

Ø 2"

APROBADO

SI

☒

NO

☐

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M. US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

F. PUESTA EN VIGENCIA

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com
