



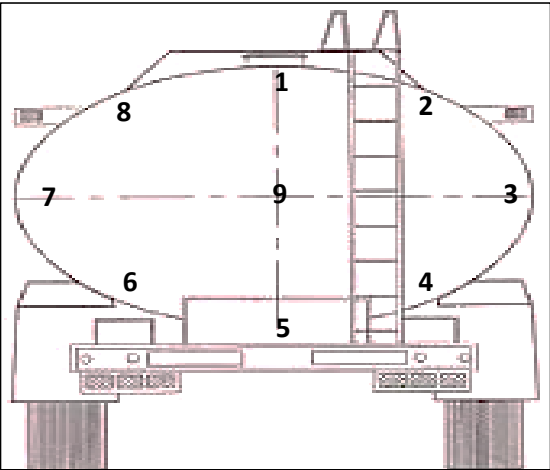












	INFORME DE I.N.D		Nº 17.427					
	CONTROL DE POZO		HOJA 1 de 5					
			CATEGORIA INSPECCIÓN					
IV								
PROCEDIMIENTO:	PO-45	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	18	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.936	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	TORREGIANI		MODELO:	N/A	CAPACIDAD:	30 M³		
INTERNO:	#CL 30		DOMINIO:	MWQ-987	VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado		Limpieza Mecánica	X			
Inspe. Us Cisterna		X	Cisterna	X	Línea	X	Falla	X
Prueba de Estanqueidad Cisterna		Si	X	No				
Prueba Hidráulica:								
Válvula de Seguridad			X	Presión de Diseño	1500	PSI		
				Presión de Prueba	1500	PSI		
Línea			X	Presión de Diseño	2500	PSI		
				Presión de Prueba	2500	PSI		
Manguerote			X	Presión de Diseño	3000	PSI		
				Presión de Prueba	3000	PSI		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV		9296		61245		19/5/2025		may-30
YUGO		0586		61246		6/5/2025		may-30
EQUIPO UT1		202000541886		61239		22/11/2024		22/11/2025
BOBINA AC-DC		1414		61248		21/5/2025		21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028
DETALLE DE INSPECCIÓN								
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO				
Detección de Fisuras		X						
Estado de Golpeador		X						
Estado de Línea		X						
Estado de Cisterna		X						
Estado General		X						
Aprobación según procedimientoNº PO-45 ASME V;B 31.3 ;API 570; ASTM-797						SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS								
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº	
							FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN				

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.427					
	CONTROL DE POZO		HOJA 2 de 5					
				W.O.				
PROCEDIMIENTO:	PO-45	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	18	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	Nº PARTE:	3.936	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
								
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							Milímetros (mm)	
Punto	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4		
1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,6	6,3		
2	6,5	6,4	6,2	6,4	6,4	6,3		
3	6,3	6,2	6,3	6,3	6,5	6,4		
4	6,2	6,6	6,2	6,2	6,6	6,5		
5	6,1	6,6	6,2	6,6	6,2	6,3		
6	6,4	6,2	6,1	6,5	6,6	6,1		
7	6,5	6,5	6,0	6,3	6,5	6,6		
8	6,2	6,5	6,6	6,5	6,4	6,6		
9	6,1	6,3	6,5	6,3	6,4	6,5		
								
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			PRECINTO Nº					
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.427																											
	CONTROL DE POZO		HOJA 3 de 5																											
				W.O.																										
PROCEDIMIENTO:	PO-45	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	18	10	2025																						
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	Nº PARTE:	3.936	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																									
<div>MEDICIÓN DE ESPESORES US-GOLPEADOR</div> <div></div> <div></div>																														
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							Milímetros (mm)																							
Punto	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4																								
1	14,7	14,9	15,2	14,6	15,1	-																								
2	15,1	15,0	15,1	15,5	15,4	-																								
3	15,3	15,4	15,6	15,6	15,4	-																								
4																														
<div><div><table><tr><td colspan="2">VALVULA DE VENTEO</td></tr><tr><td>Nº</td><td>184-1</td></tr><tr><td>Ø</td><td>4"</td></tr><tr><td>PH</td><td>500 PSI</td></tr></table></div><div><table><tr><td colspan="2">VALVULA DE VENTEO</td></tr><tr><td>Nº</td><td>184-2</td></tr><tr><td>Ø</td><td>4"</td></tr><tr><td>PH</td><td>500 PSI</td></tr></table></div><div><table><tr><td colspan="2">VALVULA DE SEGURIDAD</td></tr><tr><td>Ap</td><td>1500</td></tr><tr><td>PRECINTO</td><td>9569/9568</td></tr></table></div></div>									VALVULA DE VENTEO		Nº	184-1	Ø	4"	PH	500 PSI	VALVULA DE VENTEO		Nº	184-2	Ø	4"	PH	500 PSI	VALVULA DE SEGURIDAD		Ap	1500	PRECINTO	9569/9568
VALVULA DE VENTEO																														
Nº	184-1																													
Ø	4"																													
PH	500 PSI																													
VALVULA DE VENTEO																														
Nº	184-2																													
Ø	4"																													
PH	500 PSI																													
VALVULA DE SEGURIDAD																														
Ap	1500																													
PRECINTO	9569/9568																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																											
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																											
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																									

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.427					
	CONTROL DE POZO		HOJA 4 de 5					
				W.O.				
PROCEDIMIENTO:	PO-45	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	18	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	Nº PARTE:	3.936	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO (EN mm)								
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4				
PLANO A	8,7	8,5	8,5	8,7				
PLANO B	8,4	8,6	8,7	8,5				
PLANO C	8,6	8,8	8,5	8,6				
PLANO D	8,6	8,6	8,8	8,7				
PLANO E	8,6	8,5	8,7	8,8				
PLANO F	8,5	8,7	8,6	8,6				
PLANO G	8,4	8,6	8,6	8,5				
PLANO H	8,7	8,4	8,6	8,6				
PLANO I	8,7	8,7	8,9	8,7				
PLANO J	8,8	8,7	8,9	8,7				
PLANO K	8,9	8,6	8,9	8,8				
PLANO L	8,8	8,7	8,7	8,7				
PLANO M	8,9	8,7	8,5	8,7				
PLANO N	8,8	8,5	8,7	8,7				
PLANO O	8,9	8,7	8,6	8,7				
PLANO P	8,6	8,7	8,5	8,7				
PLANO Q	8,8	8,7	8,9	8,7				
PLANO R	8,8	8,8	8,7	8,6				
					PRECINTO Nº			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP					FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.427					
	CONTROL DE POZO		HOJA 5 de 5					
				W.O.				
PROCEDIMIENTO:	PO-45	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	18	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	Nº PARTE:	3.936	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MANGUEROTE								
LONGITUD	15 MTS							
PH	3000 PSI							
Nº IDENT	#019							
DIÁMETRO	2"							
APROBADO	SI	X	NO					
PERNO REY								
MARCA	TORMECAN							
CAPACIDAD	65 TONELADAS							
Nº IDENT	#30-1							
DIÁMETRO	Ø 50,9"							
APROBADO	SI	X	NO					
	GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº					
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN				

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com
